PROPOSAL PENAWARAN · OKTOBER 2026

EquipRent Enterprise

Sistem terintegrasi untuk rental & penjualan alat berat: sewa & jual, logistik, pembelian, keuangan, akuntansi dan pajak dalam satu platform.

DIAJUKAN KEPADA
[Nama Perusahaan Klien]

DISUSUN OLEH
Tim IT EquipRent

NOMOR
[No. Proposal]

BERLAKU
30 hari sejak tanggal proposal

Rp100.000.000
fixed price · all-in

1 · RINGKASAN

Satu sistem untuk seluruh alur bisnis rental & jual alat berat

EquipRent Enterprise menghubungkan pelanggan, order, pengiriman, stok, tagihan, pembelian, kas, akuntansi dan pajak, sehingga setiap transaksi cukup dicatat sekali dan langsung muncul di laporan.

8
modul terintegrasi
Sewa & jual, tagihan, logistik, pembelian, kas, akuntansi, pajak, administrasi

6
peran pengguna
Hak akses per peran, ubah data lewat persetujuan

5 bln
sampai go-live
Lalu 4 bulan pendampingan & maintenance

100 jt
fixed price, all-in
Termasuk server 1 tahun, training, migrasi data

Prototype 68 halaman sudah bisa dicoba sebelum kontrak, sehingga alur dan tampilan bisa disepakati sejak awal.

2 · MASALAH YANG KAMI LIHAT

Operasional berjalan, tapi datanya terpisah-pisah

Data tercecer di kertas & Excel
Order, surat jalan dan stok dicatat terpisah, sulit dicocokkan dan diaudit.

Pengiriman sulit dipantau
Posisi alat, estimasi tiba dan keterlambatan ekspedisi baru diketahui belakangan.

Tagihan & piutang lambat
Rekap sewa dihitung manual; piutang lewat jatuh tempo tidak terlihat saat order baru disetujui.

Pembukuan & pajak manual
Jurnal, neraca, laba rugi dan PPN / PPh 23 disusun ulang dari laporan kas setiap periode.

3 · SOLUSI

Satu alur, dari order sampai laporan pajak

Setiap langkah mengisi data untuk langkah berikutnya. Contohnya, pembayaran invoice otomatis masuk buku kas, lalu jurnal, lalu laporan pajak.

01 **Pelanggan & Proyek**
Pelanggan sebagai master: satu halaman memuat proyek, sewa dan jualnya. Proyek berisi kebutuhan alat dan tenggat yang bisa disesuaikan.

02 **Order Sewa / Jual**
Order sewa atau jual langsung dari customer, lengkap dengan nama alat, quantity dan harga satuan (tarif sewa per hari).

03 **Persetujuan Order**
Order disetujui setelah data pelanggan dan proyek dicek, termasuk piutangnya. Stok dipesan begitu disetujui.

04 **Surat Jalan & Ekspedisi**
Buat surat jalan → Estimasi tiba → Berangkat → Update posisi → Serah terima
Diisi Logistik untuk kirim sewa, jual & pemulangan. Lama telat ekspedisi tercatat otomatis.

05 **Pemulangan & Inspeksi**
Alat dijemput dari stok proyek dalam satu surat jalan. Saat inspeksi, alat rusak dicatat per item lalu diklaim ke pelanggan.

06 **Rekap Tagihan & Invoice**
Sewa dihitung otomatis dari surat jalan kirim & pulang (hari × qty × tarif harian). Untuk kasus khusus, rekap bisa disusun manual.

07 **Pembayaran & Kas**
Pembayaran tercatat sebagai bon biru / merah, lengkap dengan laporan kas dan rekonsiliasi rekening koran.

08 **Akuntansi & Pajak**
Jurnal otomatis, buku besar, kertas kerja, laba rugi per proyek, neraca, serta PPN & PPh 23 dalam format XML Coretax.

4 · KONTROL DATA

Setiap orang hanya melihat & mengerjakan bagiannya

Admin | Logistik (termasuk ekspedisi & data pengemudi) | Staff Piutang | Finance | Accounting & Tax | Purchase

Edit via persetujuan
Hanya Admin yang mengubah / menghapus; staf mengajukan, Accounting menyetujui.

Persetujuan order
Order disetujui setelah pelanggan & proyek dicek. PR yang disetujui Finance langsung jadi PO.

Jejak lengkap
Setiap transaksi mencatat siapa, kapan & nomor dokumennya.

5 · CAKUPAN SISTEM

Delapan modul dalam satu aplikasi

Pelanggan, Proyek & Order

- Pelanggan memuat proyek, sewa & jual
- Proyek dengan kebutuhan alat & tenggat
- Order dari customer: alat, qty, harga satuan
- Disetujui setelah pelanggan & proyek dicek

Laporan: Rekap Project per order & per proyek

Tagihan & Piutang

- Rekap tagihan otomatis dari surat jalan
- Kasus khusus: rekap disusun manual
- Invoice sewa, jual & klaim
- Pembayaran cicilan / lunas

Laporan: Laporan Piutang per pelanggan & umur piutang

Logistik & Stok

- Surat jalan sewa, jual & pemulangan
- Ekspedisi, kendaraan & pengemudi didata Logistik
- Lama telat ekspedisi tercatat (dasar denda)
- Inspeksi: daftar alat rusak → klaim
- Stok gudang & stok proyek

Laporan: Laporan Stok, Rekap Stok Proyek, daftar keterlambatan

Pembelian

- Master vendor
- Purchase request disetujui langsung jadi purchase order
- Term of payment & pajak
- Uang muka, pelunasan, tempo

Laporan: Laporan Pembelian & Hutang Dagang (umur hutang)

Kas & Bank

- Bon biru (masuk) & bon merah (keluar)
- Pindah dana antar rekening
- Rekonsiliasi bank dari rekening koran

Laporan: Laporan Kas per periode & per rekening

Akuntansi

- Bagan akun (COA) per bulan
- Jurnal otomatis dari kas, invoice, pembelian
- Buku besar, kertas kerja, jurnal penyesuaian

Laporan: Laba rugi per proyek & keseluruhan, neraca

Pajak

- PPN keluaran & masukan
- PPh 23 dipotong & disetor
- Ekspor XML untuk upload ke Coretax

Laporan: Rekap PPN & PPh 23 per masa pajak


Administrasi

- 6 peran & hak akses
- Permintaan perubahan data dengan persetujuan
- Notifikasi

Laporan: Dasbor per peran & log aktivitas


6 · PROTOTYPE

Prototype 68 halaman sudah bisa dicoba

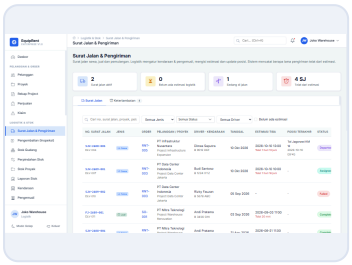


Surat Jalan & Ekspedisi

Estimasi tiba, update posisi, lama telat ekspedisi

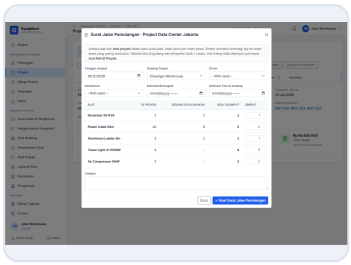

Pemulangan

Dijemput dari stok proyek dalam satu surat jalan

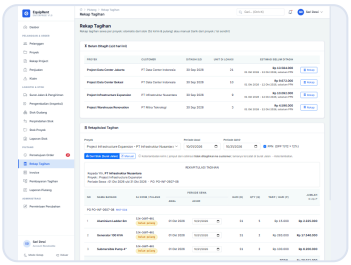

Rekap Tagihan

Hari × qty × tarif harian dari surat jalan

Coba langsung: **[link prototype]** · tersedia login demo untuk setiap peran.

7 · TEKNOLOGI

Aplikasi web, bisa dibuka dari mana saja

KOMPONEN	YANG DIPAKAI
Aplikasi	Laravel (PHP) + MySQL
Akses	Browser di laptop & HP, tanpa instal
Server	Cloud server dengan HTTPS / SSL, backup otomatis harian
Keamanan	Login per pengguna, hak akses per peran, log aktivitas

8 · JADWAL

Go-live di bulan ke-5, didampingi sampai bulan ke-9

Dihitung sejak kontrak ditandatangani dan termin pertama diterima.

FASE	WAKTU	KEGIATAN	HASIL
1. Analisis & desain final	Bulan 1	Review prototype bersama, finalisasi alur & data	Desain disetujui
2. Modul operasional	Bulan 2–3	Pelanggan, order sewa & jual, tagihan, logistik, stok	UAT tahap 1
3. Modul keuangan	Bulan 4	Pembelian, kas & bank, akuntansi, pajak	UAT tahap 2
4. Go-live	Bulan 5	Migrasi data, pelatihan per peran, mulai dipakai	Sistem berjalan
5. Pendampingan	Bulan 6–9	Perbaikan bug, penyesuaian kecil, monitoring	Sistem stabil

9 · INVESTASI

Rincian biaya Rp100.000.000

KOMPONEN	BIAYA (RP)
Analisis kebutuhan & desain sistem	8.000.000
Modul administrasi, peran & persetujuan	8.000.000
Modul pelanggan, proyek, sewa & jual	12.000.000
Modul logistik, stok, ekspedisi & klaim	14.000.000
Modul tagihan, invoice & pembayaran	10.000.000
Modul pembelian & hutang dagang	8.000.000
Modul kas & bank, akuntansi, pajak	14.000.000
Migrasi data & konfigurasi	4.000.000
Pengujian (UAT) & go-live	5.000.000
Server cloud, domain & SSL (1 tahun)	6.000.000
Pelatihan pengguna per peran	3.000.000
Pendampingan & maintenance 4 bulan	8.000.000
Total (fixed price)	**100.000.000**

Baris berlatar biru adalah pengembangan modul (Rp66.000.000). Harga belum termasuk PPN [jika ada].

10 · TERMIN PEMBAYARAN

Dibayar bertahap, mengikuti hasil kerja

30%
Rp30.000.000
Saat kontrak ditandatangani

30%
Rp30.000.000
Lolos UAT tahap 1 (modul operasional)

30%
Rp30.000.000
Go-live, sistem dipakai harian

10%
Rp10.000.000
Akhir masa pendampingan 4 bulan

11 · CAKUPAN BIAYA

Yang termasuk dan yang tidak

Termasuk

- Semua modul dalam proposal ini
- Server cloud, domain & SSL tahun pertama
- Migrasi data dari Excel / sistem lama
- Pelatihan per peran & panduan pengguna
- UAT, go-live, pendampingan 4 bulan
- Perbaikan bug tanpa biaya selama pendampingan

Tidak termasuk

- Perangkat keras: laptop, HP, printer
- GPS tracking otomatis & WhatsApp API
- Integrasi langsung ke sistem DJP / bank
- Fitur baru di luar proposal (dihitung terpisah)
- Biaya server mulai tahun kedua

12 · SETELAH PENDAMPINGAN

Biaya lanjutan yang perlu direncanakan

POS	PERKIRAAN	KETERANGAN
Server tahun ke-2 dst.	± Rp2.500.000 / tahun	Estimasi, mengikuti harga penyedia cloud saat perpanjangan
Dukungan bulanan (opsional)	[Rp__ / bulan]	Perbaikan, backup, update keamanan, bantuan pengguna
Fitur baru	Per permintaan	Diestimasi bersama dan disetujui tertulis sebelum dikerjakan

13 · LANGKAH BERIKUTNYA

Mulai dari demo prototype, go-live lima bulan kemudian

1
Demo & review
Demo prototype dan pembahasan proposal bersama tim klien.

2
Kontrak
Sepakati cakupan akhir, lalu tanda tangan kontrak.

3
Kick-off
Termin pertama (30%) diterima, proyek dimulai.

Kontak
Raindi Andreas · Direktur · [No. HP / WhatsApp] · [Email]

PERSETUJUAN

Lembar persetujuan proposal

Dengan menandatangani lembar ini, kedua pihak menyetujui cakupan, jadwal, nilai investasi Rp100.000.000 dan termin pembayaran dalam proposal ini sebagai dasar penyusunan kontrak.

Pihak Klien

[Nama Perusahaan Klien]

Nama: _____

Jabatan: _____

Tanggal: _____

Penyedia

Tim IT EquipRent

Nama: Raindi Andreas

Jabatan: Direktur

Tanggal: _____
